

<フミン・コーティング作業工程の写真説明>

施工名称：KDX門前仲町ビル4F フミンコーティング

場所(住所)：東京都江東区牡丹1丁目14-1

施工日・年月日：2016年8月27日(土曜日)～28日(日曜日)2日間

施工面積：60.147㎡ / 施工作業人数：5名

RBM立会い：藤平 晃司 様

金属へら(スクレーパー)にて汚れ落とし作業



コンパウンド作業、終了後IPAにて完全ふき取り



養生作業終了




フミン・コーティング作業



フミン・コーティング作業終了



サーモクロンGで、30分間隔温度測定装置セット

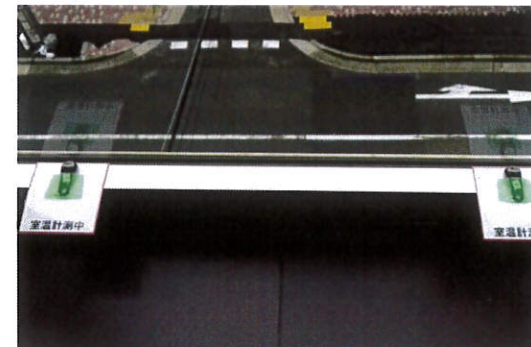

(太陽光同条件にて比較=左:塗布面/右:未塗布面)



株式会社 ゼニス・アドバン
<http://www.zenith-advan.com>
